



**INFORME FINAL DE
INSPECCIÓN
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS**




19/9/2022	SEGÚN PROCEDIMIENTO ASME V.	QUALITEST SRL
Fecha del informe	Descripción	Aprobó
 <small>SERVICIOS INDUSTRIALES</small>	PILETA DE ACUMULACION CTR-ACU 001	 GRUPO CONCRETO <small>Concretar SRL & CAA SRL</small> <small>Construyendo Futuro</small>
<i>Queda terminantemente prohibido la reproducción parcial o total del presente informe sin su previa autorización escrita</i>		INFORME FINAL Nº OT 1598

FECHA DE INSPECCION:	19/9/2022	CERTIFICACION:	ANUAL
CLIENTE:	CONCRETAR SRL	TRABAJO A REALIZAR:	ESTANQUEIDAD
Nº DE OT:	1598	Nº INFORME FINAL:	QT 1598
IDENTIFICACIÓN:	CTR- ACU 001	BASE:	CONCRETAR
RESP. QUALITEST:	Op. J.Sisto	RESP. CLIENTE:	Raul Martin
NORMA/CÓDIGO EVALUACIÓN:	ASME V	VENCIMIENTO INSP.:	19/9/2023

PIEZAS INSPECCIONADAS

ITEM	NOMBRE DE PIEZA	Nº SERIE	PRECINTO NUEVO	RESULTADO
1	PILETA DE ACUMULACION	CTR- ACU 001	QT 1598- SET 22- IV-E	APROBADO

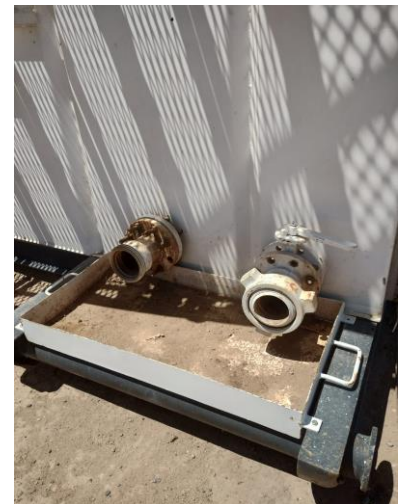

OBSERVACIONES:

Se realiza Ensayo de Estanqueidad a Pileta de Acumulacion n° de serie ACU-001 de 60m3.

RESULTADO DE INSPECCION:

Aprobado. No se detectan perdidas ni descenso del volumen de agua durante un lapso de tiempo de 24hs.

INSPECCION VISUAL:

RESULTADO INSPECCION: **Aprobado**. No se observan indicaciones relevantes, los coneccionados se encuentran en buen estado, junto con los componentes de seguridad.

INSPECCION / EVALUACION

CLIENTE

ALEX G. BROGIN
LP 2, PM 2, US 1-IRAM - ISO 9712
Nº Certificado LP: 005/LP/2/1133
Nº Certificado PM: 005/PM/2/876
Nº Certificado US: 005/US/1/731



JAVIER A. SISTO
IRAMNM - ISO 9712:2009
PM LP NIVEL II
QUALITEST S.R.L.

